



第四區管理處 停水作業計畫

工程名稱：**中區成功路等汰換管線工程
(第一階段)**

台灣自來水公司
中華民國 114 年 6 月

台灣自來水公司第四區管理處停水作業計畫

目錄

一、前言	3
二、影響範圍與戶數	3
三、施工日期	3
五、施作流程	3
六、供水調度因應作為	3
八、其他事項	4
附錄(一) 台灣自來水公司第四區管理處停水報告單	5
附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表	6
施工地點示意圖	10
停水地區(附件一)	11
降壓地區(附件二)	13

一、前言

本工程施工地點位於中區，辦理中區成功路等汰換管線工程，停水改接當日影響用戶數約為 2000 戶。為確保停水作業順暢，擬訂本作業計畫書作為施工依據。

二、影響範圍與戶數

(一)停水地區：(詳附件一)

北區：新興里(部分)

中區：中華里(部分)、大誠里、柳川里、大墩里、光復里、公園里、繼光里、綠川里。

上述停水影響範圍「民權路以東、雙十路一段以西、中華路一段/中華路二段/福音街/精武路以南、建國路以北等一帶。」

(二)降壓地區：(詳附件二)

西區：平和里(部分)、公民里(部分)、廣民里、三民里(部分)、利民里(部分)、民生里。

上述降壓影響範圍「林森路以東、民權路以西、中華路一段/柳川西路二段以南、建國路以北等一帶。」

三、施工日期


114 年 6 月 16 日至 114 年 7 月 31 日(備註:依臺中市政府挖掘管理科核發路證為準)，周一至周六每日 8 時 30 分至 22 時 00 分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時本停水計劃截止日順延。

四、停水日期

114 年 7 月 1 至 114 年 7 月 31 日，(非連續停水)僅路口制水閥更新及沿線用戶改接自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。

五、施作流程

規劃預計辦理改善之區域管線設置位置後，報陳相關單位核定後，據以進場施作。現場施工順序如下：



六、供水調度因應作為

- 1、送水車按規劃路線填滿臨時供水站，並於復水前，裝滿管線末端與地勢較高致復水較慢地區用戶使用。

- 2、停水前應先儲滿各蓄（配）水池。
- 3、先將停水區內低地區與大用戶（每月用水超過一千度之非工業用水戶）、工業用水戶，有大蓄水池容易進水之管線先行關閉，盡量保持主幹管內之水量與水壓。
- 4、每日統計各項限水數據（用戶查詢電話、載水次數與數量等）。
- 5、載水站、載水車之指揮與管理。

七、停水宣傳方式

撰寫停復水施工停水訊息單，並於本公司網站上刊登停限水訊息，配合停水簡訊發送…等方式，告知用戶停水時程、停（復）水時應注意事項。

八、其他事項

- （一）為配合飲用水條例施行，施工完成後請加強排水清洗，以維用水品質，如因清洗不完全，所造成之損失，由承商負責。
- （二）承商先行規劃車行路線，置好交通錐、警示燈等措施，引導車輛行進方向，施工時應依規定作好一切工安措施，以確保工程及人員安全。
- （三）非整日停水僅幹管改接及用戶施作須停水，每日施工路段（約 60-100 公尺）週邊用戶停水（影響戶數約數十戶不等），每日 8 時 30 分至 18 時 30 分，請用戶利用晚上儲水備用。
- （四）水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，適逢用水尖峰期，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，擬依情況延後 2-4 小時恢復供水，敬請見諒。
- （五）敬請影響地區用戶儲水備用，節約使用，停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過熱損壞，施工、停水期間造成不便之處，敬請見諒。

台灣自來水公司第四區管理處停水報告單

項 目	內 容
一、工程名稱	中區成功路等汰換管線工程【RC-114-0401-0023】
二、施工地點	台中市中區
三、停水原因	辦理中區成功路等汰換管線工程路口改接(第一階段) 施工時間自 114 年 7 月 1 日至 114 年 7 月 31 日
四、停水時間	停水時間預計 114 年 7 月 1 日至 114 年 7 月 31 日(非連續停水)僅路口制水閥更新及沿線用戶改接自當日 8 時 30 分至 18 時 30 分。 *〔用戶改接僅每日施工路段(約 60 公尺)週邊用戶停水(影響戶數約數十戶不等) 假日及雨天不施工。〕
五、停水區域 (含水壓降低地區)	停水區域(詳附件一): 北區: 新興里(部分) 中區: 中華里(部分)、大誠里、柳川里、大墩里、光復里、公園里、繼光里、綠川里。 上述停水影響範圍「民權路以東、雙十路一段以西、中華路一段/中華路二段/福音街/精武路以南、建國路以北等一帶。」 降壓區域(詳附件二) 西區: 平和里(部分)、公民里(部分)、廣民里、三民里(部分)、利民里(部分)、民生里。 上述降壓影響範圍「林森路以東、民權路以西、中華路一段/柳川西路二段以南、建國路以北等一帶。」
六、減少供水量	預計減少供水量: 2000 立方公尺。
七、停水戶數	(一)當日停水戶數: 2000 戶。
備 註	一、倘遇雨或因特殊原因發生無法施工可能取消停水,待下次停水日期決定後,當再行通知。 二、如工程提早完成則提早供水,倘工作發生特殊困難亦可能略延緩供水,停水不便之處,敬請 見諒。 三、若有任何停水問題請電洽(04-22542191 台中服務所) (04-22442469 台中給水廠,1910),或上本公司網站查詢。

廠所: 台中給水廠

區處 ☐操作課 ☐業務課: 處長:

附錄(二) 里長及相關單位協調連絡人員表

台灣自來水公司第四區管理處「中區成功路等汰換管線工程」

里長及相關單位協調連絡人員表

項目	里別及相關單位	里長及連絡人	聯絡電話	連絡地址	備註
1	新興里	曹中萍	04-22114286	臺中市北區精武路 223 號	停水
2	中華里	廖榮中	04-22223377	臺中市東區臺灣大道一段 581 號	停水
3	大誠里	林志隆	04-22228888	臺中市東區福音街 33 號	停水
4	柳川里	蔡翠碧	04-22202911	臺中市東區三民路二段 183 巷 23 號	停水
5	大墩里	張文華	04-22214966	臺中市東區三民路二段 93 號	停水
6	光復里	張富星	04-22226800	臺中市東區市府路 159 號	停水
7	公園里	陳裕明	04-22226636	臺中市東區中山路 79 號	停水
8	繼光里	吳禎耀	04-22238490	臺中市東區繼光街 101 號	停水
9	綠川里	楊文宏	04-22226408	臺中市東區光復路 35 號	停水
10	平和里	張洪惠雪	04-22221058	臺中市西區中華路一段 1 號 4 樓之 6	降壓
11	公民里	林鈞陶	0928388498	臺中市西區五廊街 155 號	降壓
12	廣民里	林水順	04-23717223	臺中市西區自治街 11 號 2 樓	降壓
13	三民里	廖吳芬芳	04-22219336	臺中市西區三民路一段 183 巷 7 之 1 號	降壓
14	利民里	陳敏祥	04-22208272	臺中市西區民生路 37 號	降壓

15	民生里	黃文濱	04-22232797	臺中市西區綠川西街 33 號	降壓
16	台中給水廠廠長	孫智強	(04)22442469	臺中市遼寧路一段三號	
17	台中給水廠工務股股長	許喬宇	(04)22442469	臺中市遼寧路一段三號	
18	台中給水廠監造人員	徐一仁	(04)22442469	臺中市遼寧路一段三號	
19	永樺工程有限公司	卓永昌	0921-789393	臺中市大雅區龍善街 29 巷 18 號	
20	欣中瓦斯		(04)23139999	臺中市西屯區天水中街 36 號	
21	台電		(04)24924760		
22	中華電信		(04)22918175		

台灣自來水公司第四區管理處

◎ 施工及停水訊息 ◎

一、施工及停水緣由：

本公司為提供量足質優自來水，以提升民眾用水品質，辦理「**中區成功路等汰換管線工程**」，管線改接施工時，將造成部份區域停水，其停水區域、時間詳述於後。

二、施工期間：

114年6月16日至114年7月31日(備註:依臺中市政府挖掘管理科核發路證為準)，周一至周六每日8時30分至22時00分。施工中遇有不可抗拒因素停工或遇雨順延之狀況時本停水計劃截止日順延。

三、停水時間:(分段施工、分段停水、夜間恢復供水)

114年7月1至114年7月31日，(非連續停水)僅路口制水閥更新及沿線用戶改接自當日8時30分至18時30分。

1. 十字路口制水閥更新改接工程:(詳施工地點示意圖)配合施工路段，分段施工、分段停水，每次停水自當日上午8時30至下午18時30分
2. 施工沿線用戶給水管改接工程:每戶停水當日自上午8時30至下午18時30分

備註:施工日期非停水日期，確切停水日期將於停水日期前另行再以於本公司網站公布。

四、停水區域(詳附圖):

停水區域(詳附件一):

北區：新興里(部分)、中區：中華里(部分)、大誠里、柳川里、大墩里、光復里、公園里、繼光里、綠川里。

上述停水影響範圍「民權路以東、雙十路一段以西、中華路一段/中華路二段/福音街/精武路以南、建國路以北等一帶。」

降壓區域(詳附件二)

西區：平和里(部分)、公民里(部分)、廣民里、三民里(部分)、利民里(部分)、民生里。

上述降壓影響範圍「林森路以東、民權路以西、中華路一段/柳川西路二段以南、建國路以北等一帶。」


1. 施工期間受制水閥關閉影響，施工周邊地區管線壓力可能降低，部分地區管線末端可能有無水情況發生。
2. 影響時間：每日上午8時30分至下午20時30分，預計降壓12小時，管線巷道末端將延後2小時恢復。

註:水量輸送過程及復水調配水量須分段排氣，另恢復供水時，大樓及用戶配水池、水塔須補滿水量，故管線末端及巷弄恢復時間將略為延後。敬請影響地區用戶儲水備用、配合節約用水、**關閉抽水馬達電源**，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災並請飲用前先煮沸，造成不便之處，敬請見諒。

五、查詢電話：

台中給水廠	(04)2244-2469	台中服務所	(04) 2254-2191
施工進度查詢 永樺工程有限公司	0921-789393	客服中心	1910

施工地點範圍簡示圖

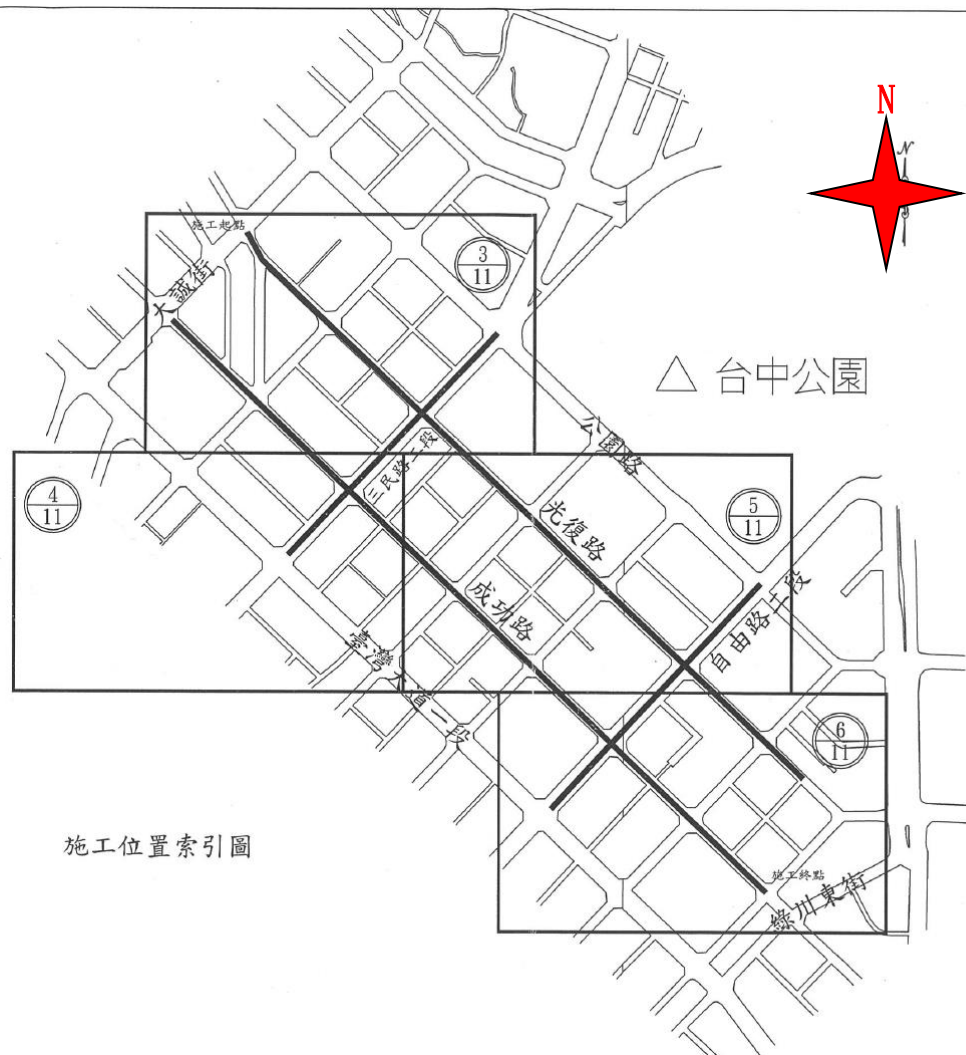

停水範圍---紅線範圍



停水區域：

備註：北區：新興里(部分)、中區：中華里(部分)、大誠里、柳川里、大墩里、光復里、公園里、繼光里、綠川里。

上述停水影響範圍「民權路以東、雙十路一段以西、中華路一段/中華路二段/福音街/精武路以南、建國路以北等一帶

附註：如遇緊急事件，需延長停水時間時本公司將另行公布於本公司網站。

停水區域示意圖

停水範圍：

北區：新興里(部分)、中區：中華里(部分)、大誠里、柳川里、大墩里、光復里、公園里、繼光里、綠川里。

上述停水影響範圍「民權路以東、雙十路一段以西、中華路一段/中華路二段/福音街/精武路以南、建國路以北等一帶

中華路一段/中華路二段/福音街/精武路以南



民權路以東

停水區域

雙十路一段以西

建國路以北

降壓範圍---藍線範圍

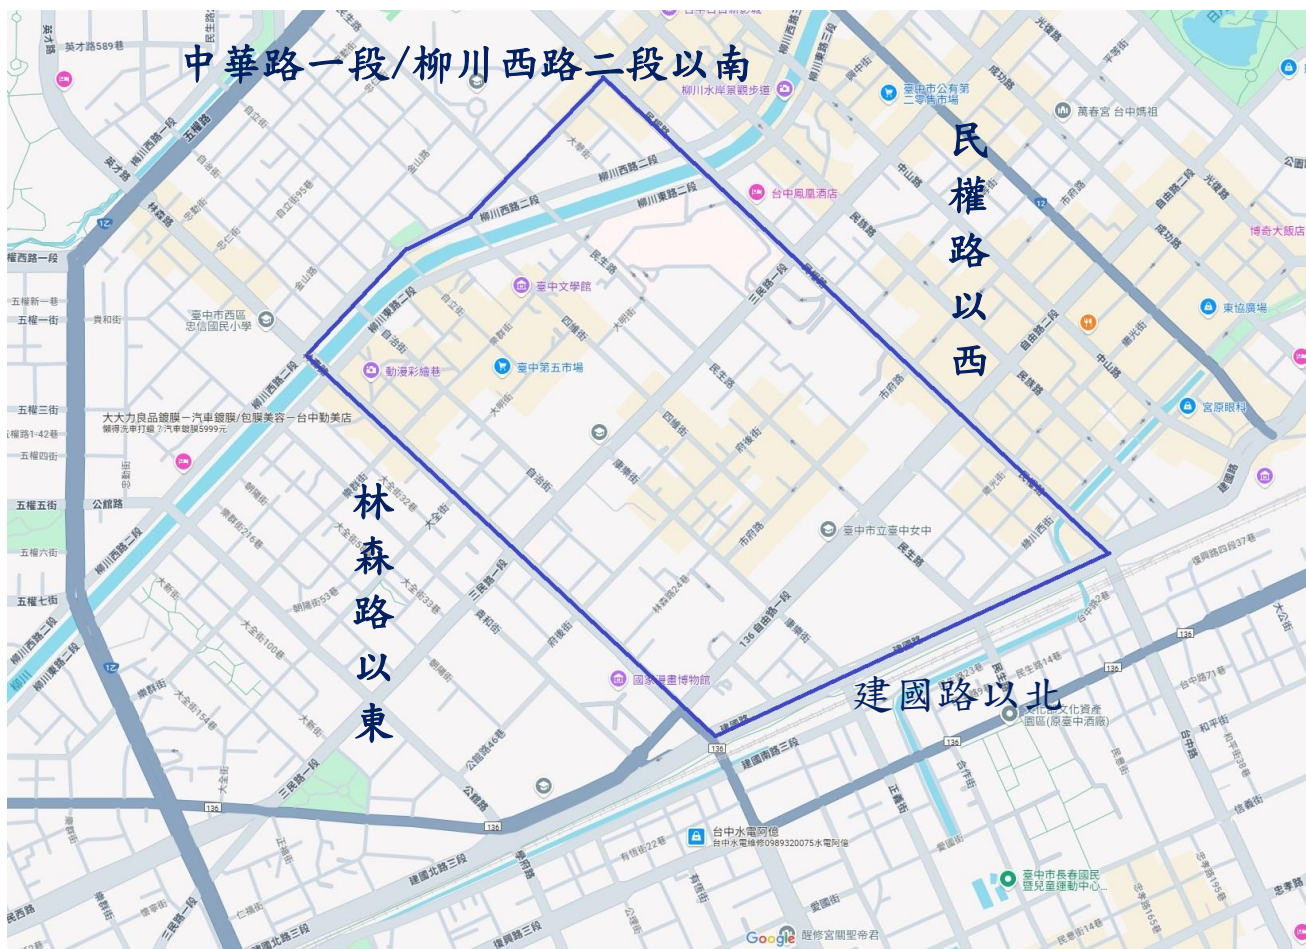

降壓區域：

備註：西區：平和里(部分)、公民里(部分)、廣民里、三民里(部分)、利民里(部分)、民生里。

上述降壓影響範圍「林森路以東、民權路以西、中華路一段/柳川西路二段以南、建國路以北等一帶

附註：如遇緊急事件，需延長停水時間時本公司將另行公布於本公司網站。

降壓區域示意圖

降壓範圍：

西區：平和里(部分)、公民里(部分)、廣民里、三民里(部分)、利民里(部分)、民生里。

上述降壓影響範圍「林森路以東、民權路以西、中華路一段/柳川西路二段以南、建國路以北等一帶

